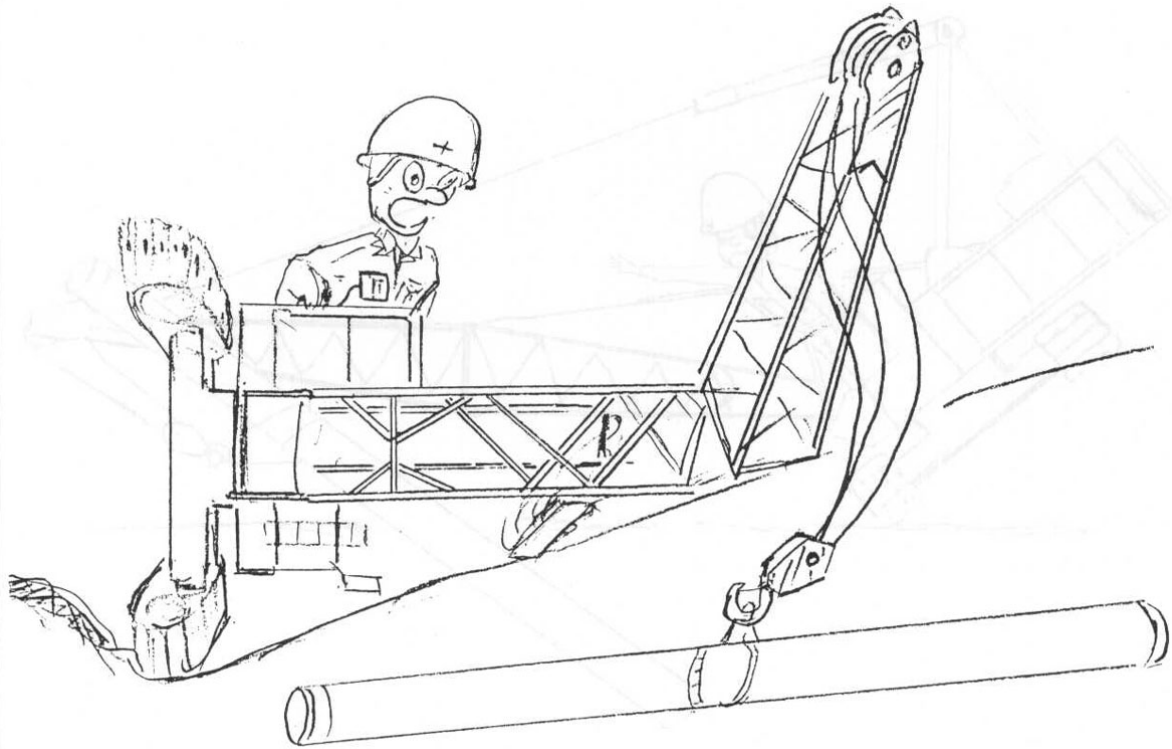


| 災害の型 | 災害の程度 | 当日の作業 | 対象機械 | 経験年数 |
|--|--|-------|--|------|
| 転倒 | 本体のみ | 杭吊り込み | 50tクローラークレーン | |
| 発生状況 | | | 要因 | |
| <p>杭打工法：中掘り根固め</p> <p>路肩下の杭を吊り上げ後進した時、クローラが路肩側に1mスリップし、そのまま転倒した。</p> | | | <p>① 無理な位置での吊り込み作業。</p> <p>② 軟弱路肩に対し注意を払わなかった。</p> <p>③ 不安定な地盤上で吊荷走行をした。</p> | |
| 対策 | <p>① 路肩は絶えず注意を払うこと。</p> <p>② 吊荷走行は行わない。(原則禁止)</p> <p>③ 誘導者をおき指示をさせる。</p> | | | |
|  | | | | |
