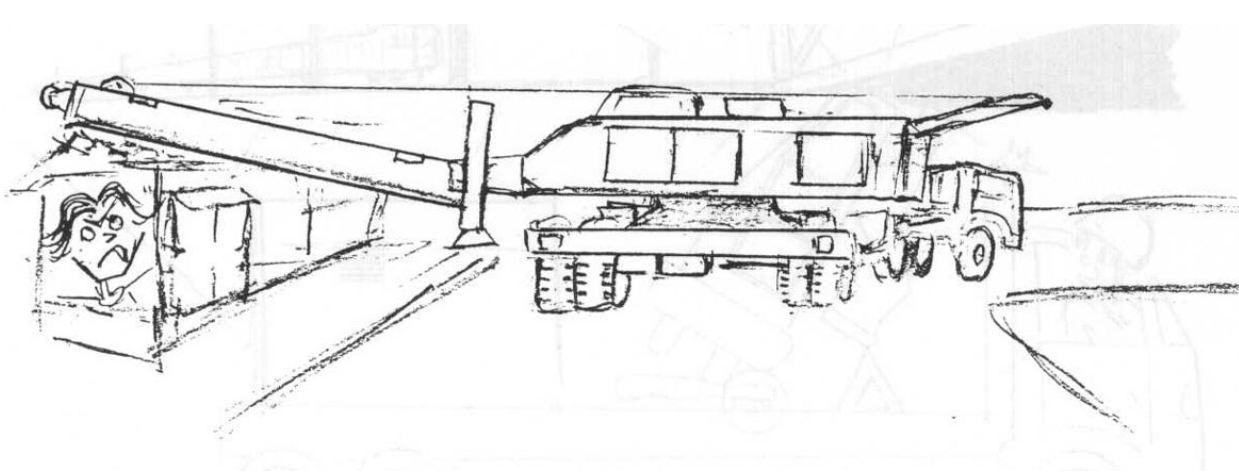


| 災害の型 | 災害の程度 | 当日の作業 | 対象機械 | 経験年数 |
|---|--|-------|---|------|
| 輸送事故 | 家屋の損傷 | 運 搬 | 三点式杭打機 | |
| 発 生 状 況 | | | 要 因 | |
| <p>工事現場に杭打機を搬入するため、トレーラに積み込み置場を出発した。</p> <p>最初の道路の曲がり角で、杭打機の上部が旋回し、リーダの先端が家屋に激突し、屋根の一部を壊した。</p> | | | <p>① 旋回ロックが入っていなかった。</p> <p>② 杭打機の積み込み責任とトレーラ運送責任が曖昧であった。</p> <p>③ リーダを固縛していなかった。</p> | |
| 対 策 | <p>① トレーラの運転手が積み込んだときでも最終荷姿のチェックを行う。</p> <p>② ワイヤロープの固縛方法、旋回ロックには注意をする。</p> <p>③ 手順書を作成しておき、誰でもまちがいなく立ち会えるようにする。</p> | | | |
|  | | | | |
